



使用材料写真

植栽工
高木植栽工

搬入時検収(ケキ)

	設計	実測
H	6.0m	6.0m
C	0.40m	0.40m
W	3.0m	3.0m



使用材料写真

植栽工
高木植栽工

搬入時検収(ケキ)

	設計	実測
H	6.0m	6.0m
C	0.40m	0.40m
W	3.0m	3.0m



使用材料写真

植栽工
高木植栽工

搬入時検収(ケキ)

	設計	実測
C	0.40m	0.40m



使用材料写真

植栽工
高木植栽工

搬入時検収(ケキ)

設計 実測
C 0.40m 0.40m



施工状況写真

植栽工
高木植栽工
エントランス左側

植穴掘削状況(ケキ)



出来形管理写真

植栽工
高木植栽工
植穴検収(ケキ)
エントランス左側

設計 実測
W 150cm 170cm
H 75cm 100cm



施工状況写真

植栽工
高木植栽工
エントランス左側

地下支柱設置状況(ケヤキ)



施工状況写真

植栽工
高木植栽工
エントランス左側

スライトアッシャー打込状況(ケヤキ)



施工状況写真

植栽工
高木植栽工
エントランス左側

時限分解ベルト
取付状況(ケヤキ)



施工状況写真

植栽工
 高木植栽工
 エントランス左側

時限分解ベルト
 取付完了状況 (ケヤキ)



施工状況写真

植栽工
 高木植栽工
 エントランス左側

時限分解ベルト
 締付状況 (ケヤキ)



施工状況写真

植栽工
 高木植栽工
 エントランス左側

地下支柱
 設置完了状況 (ケヤキ)




出来形管理写真

植栽工
 高木植栽工
 エントランス左側

土壌改良材検収(ケヤキ)

	設計	実測
バーク堆肥	94kg	100kg
AGロック	94リットル	100リットル
真砂土	0.47m ³	0.48m ³

※バーク堆肥 20kg入/袋
 ※AGロック 50リットル入/袋

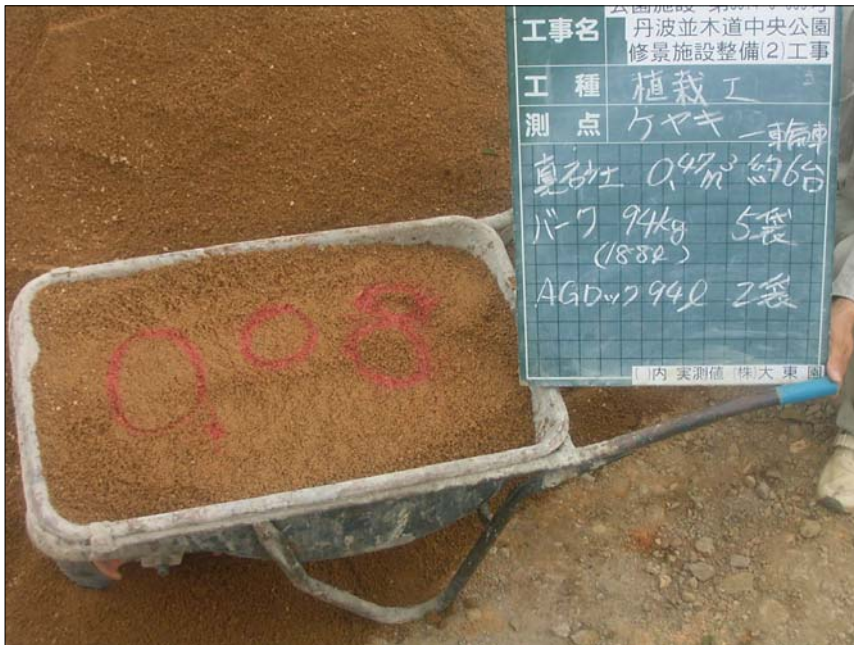


出来形管理写真

植栽工
 高木植栽工
 エントランス左側

土壌改良材検収(ケヤキ)

	設計	実測
バーク堆肥	94kg	100kg
AGロック	94リットル	100リットル
真砂土	0.47m ³	0.48m ³

※真砂土 0.08m³/一輪車1台

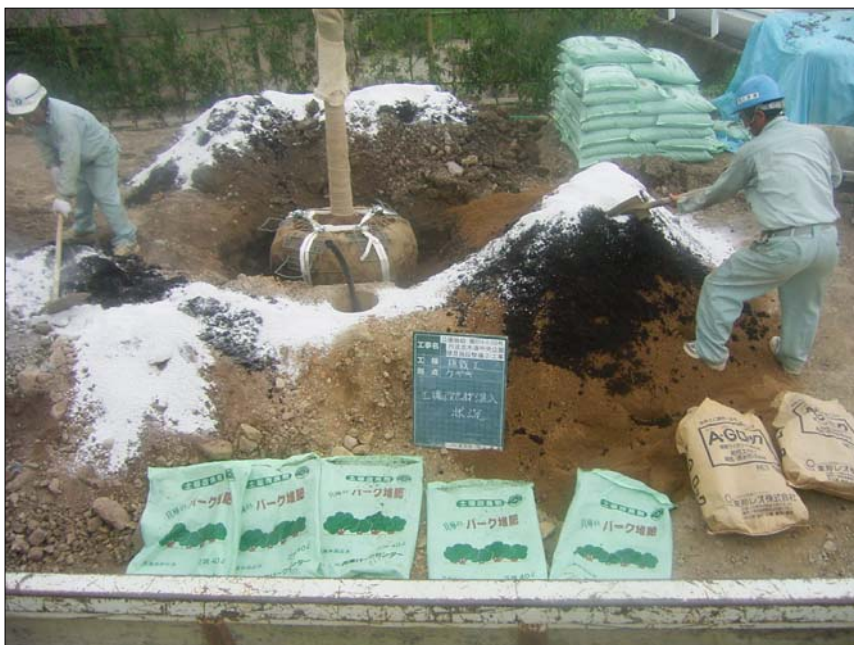

施工状況写真

植栽工
 高木植栽工
 エントランス左側

土壌改良材攪拌状況(ケヤキ)



施工状況写真

植栽工
 高木植栽工
 エントランス左側

土壤改良材
 混合理戻状況(ケキ)



施工状況写真

植栽工
 高木植栽工
 エントランス左側

植付・水締状況(ケキ)



施工状況写真

植栽工
 高木植栽工
 エントランス左側

植付完了状況(ケキ)



施工状況写真 _____

植栽工 _____

高木植栽工 _____

エントランス左側 _____

剪定整枝状況(ケキ) _____



施工状況写真 _____

植栽工 _____

高木植栽工 _____

エントランス左側 _____

剪定整枝状況(ケキ) _____

